

Obra: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO

Consiste en: TRAZO Y NIVELACIÓN CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, CORTE EN CAPAS DE TERRENO CON MEDIOS MECÁNICOS, ACARREOS, COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL EXCAVAR, SUMINISTRO, TENDIDO, MEZCLADO Y COMPACTADO DE BASE HIDRÁULICA, CAMA DE ARENA, COLOCACIÓN DE ADOQUIN CERTIFICADO DE COLOR, CONSTRUCCIÓN DE CINTURONES DE CONCRETO ARMADO, RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA EXISTENTES, REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS Y DESCARGAS SANITARIAS, LIMPIEZA FINAL DE LA OBRA.


Ubicación: CALLE LOMAS DEL TETEL, ENTRE CALLE CONSTITUCIÓN DE 1917 Y CALLE PORVENIR, SAN JOSÉ TETEL, MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAXCALA.

Fecha de inicio: 03 de noviembre de 2020
Fecha de término: 03 de diciembre de 2020
Plazo de ejecución: 31 días naturales

Tlaxcala, Tlax., a 27 de octubre de 2020.

Documento 14.- Programa calendarizado de montos - (Anexo D-1-1)

Clave	Descripción	Unidad	Total	Fecha de inicio	Fecha de término	nov.-2020	dic.-2020
1	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO						
L-2.01	TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON APARATOS TOPOGRÁFICOS, ESTABLECIENDO EJES Y REFERENCIAS PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	574,288.36	03/11/2020	03/12/2020	\$7,455.18	
L-2.04	CORTE EN CAPAS DE TERRENO CON MAQUINARIA MOTOCONFORMADORA, EN MATERIAL TIPO II, INCLUYE: APILE DE MATERIAL PARA SU POSTERIOR RETIRO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	22,672.65	03/11/2020	12/11/2020	\$22,672.65	
AC-4.02	ACARRO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, PRIMER KILÓMETRO REALIZANDO LA CARGA POR MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: MAQUINARIA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	27,484.36	03/11/2020	12/11/2020	\$27,484.36	
AC-4.03	ACARRO EN CAMIÓN DE MATERIAL MIXTO PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN, M3/KM KILÓMETROS SUBSECUENTES.	M3/KM	17,252.23	03/11/2020	12/11/2020	\$17,252.23	
ASF-28.01	COMPACTACIÓN DE LA SUPERFICIE DESCUBIERTA AL EXCAVAR, INCLUYE: Y ESCARIFICADO, ACAMELLONADO, INCORPORACIÓN DE AGUA, TENDIDO Y COMPACTADO, AL NOVENTA POR CIENTO 90% DE SU P.V.S.M. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	13,424.97	07/11/2020	16/11/2020	\$13,424.97	
ASF-28.02	SUMINISTRO, TENDIDO, MEZCLADO Y COMPACTADO DE BASE HIDRÁULICA GRAVA-ARENA, (P.V.S.M. COMPRENDIDO ENTRE 1,800 A 1,950 KG/M3, NO TEZONTLES), INCLUYE: CARGAS Y ACARREOS AL SITIO DE LA OBRA, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO AL 95% DE SU P.V.S.M., MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA, PRUEBAS DE LABORATORIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	95,036.05	11/11/2020	24/11/2020	\$95,036.05	

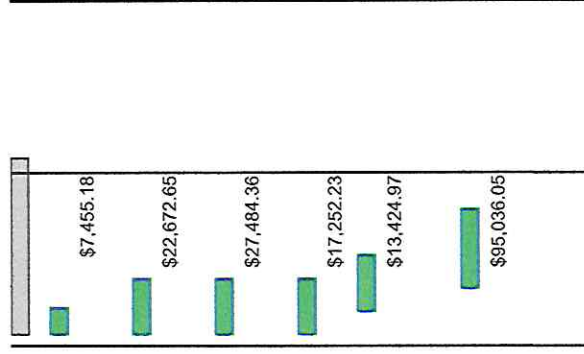

H. AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE YAUHQUEMEHCAN, TLAX. 2017-2021
OBRAS PÚBLICAS

AL-LUL CONSTRUCTORES Y PROYECTOS DE TLAXCALA S.A. DE C.V.
Calle de las Pladosas, Edificio 4
Depto 1 Unidad Santa Cruz
Chiautempan, Tlax.
241-131-72-13

[Firma manuscrita]

ADMINISTRADOR UNICO: Arq. Ana Silvia Luna Álvarez.

241-131-72-13
al-luconstruccion@outlook.com
Calle de la Pladosas, Edificio 4, Depto 1 Unidad Santa Cruz, Chiautempan Tlax.

000206
